



# Raport o stanie gminy Wałbrzych za rok 2019

## FINANSE I INWESTYCJE

## SPIS TREŚCI


1	Wykonanie Budżetu Miasta Wałbrzycha za rok 2019 .....	2
2	Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych mających wpływ na funkcjonowanie Miasta Wałbrzycha .....	3
2.1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 .....	3
2.2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim.....	4
2.3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu – („Droga Sudecka”).....	4
2.4	Remont drogi krajowej nr 35 - ul. Wałbrzyska w Wałbrzychu na odcinku od km 14+530 do Km 15+110 .....	4
2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D – ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji .....	5
2.6	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych .....	5
2.7	Zakup nieruchomości .....	5
2.8	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu .....	5
2.9	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe.....	6
2.10	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości .....	6
2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont.....	7
2.12	Adaptacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje .....	7
2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i Remont .....	7
2.14	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" .....	7
2.15	Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych .....	8
2.16	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją .....	9
2.17	Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25A na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu .....	9
2.18	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych .....	9
2.19	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych.....	10
2.20	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT.....	10
2.21	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha .....	10
3	Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny (WBP).....	10
3.1	Zadania WBP zakończone w roku 2019.....	11
3.2	Zadania WBP w trakcie realizacji.....	12

## 1 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2019

W 2019 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się nadwyżką w wysokości 30.912.725,64 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych zrealizowało przychody na kwotę 75.896.587,81 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 45.431.152,00 zł. Wynik operacyjny budżetu (nadwyżka operacyjna), stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią wynosi 26.939.770,75 zł.

W 2019 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 775.008.826,51 zł, tj. na poziomie 96,21 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne - 488.704.440,62 zł
- subwencja ogólna - 135.332.844,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa - 150.971.541,89 zł.

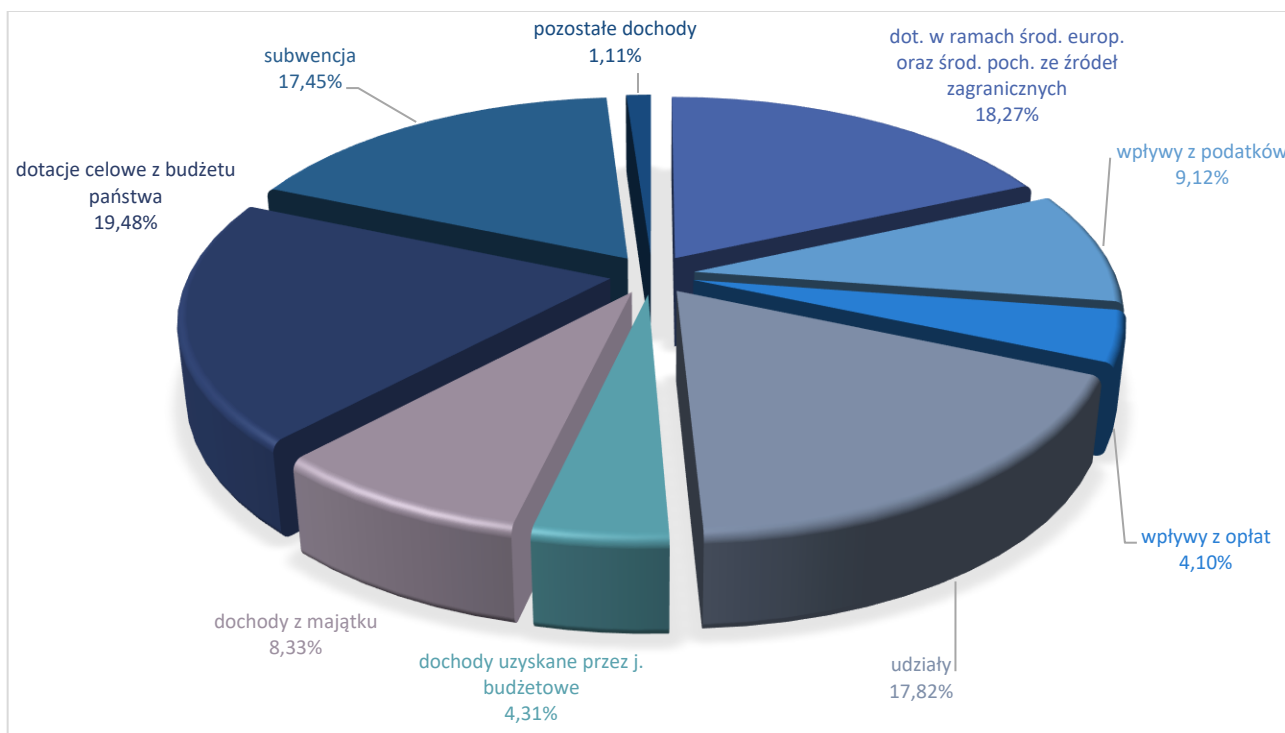


Wykres 1. Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za 2019 roku według ważniejszych źródeł dochodów

W 2019 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 744.096.100,87 zł, tj. na poziomie 83,90% planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 590.221.978,44 zł
- wydatki majątkowe 153.874.122,43 zł

Największy udział w realizacji wydatków w 2019 roku miały następujące działy:

- Transport i łączność - 160.821.192,95 zł
- Oświata i wychowanie - 141.520.056,21 zł
- Rodzina - 137.337.549,77 zł
- Gospodarka mieszkaniowa - 66.687.373,16 zł

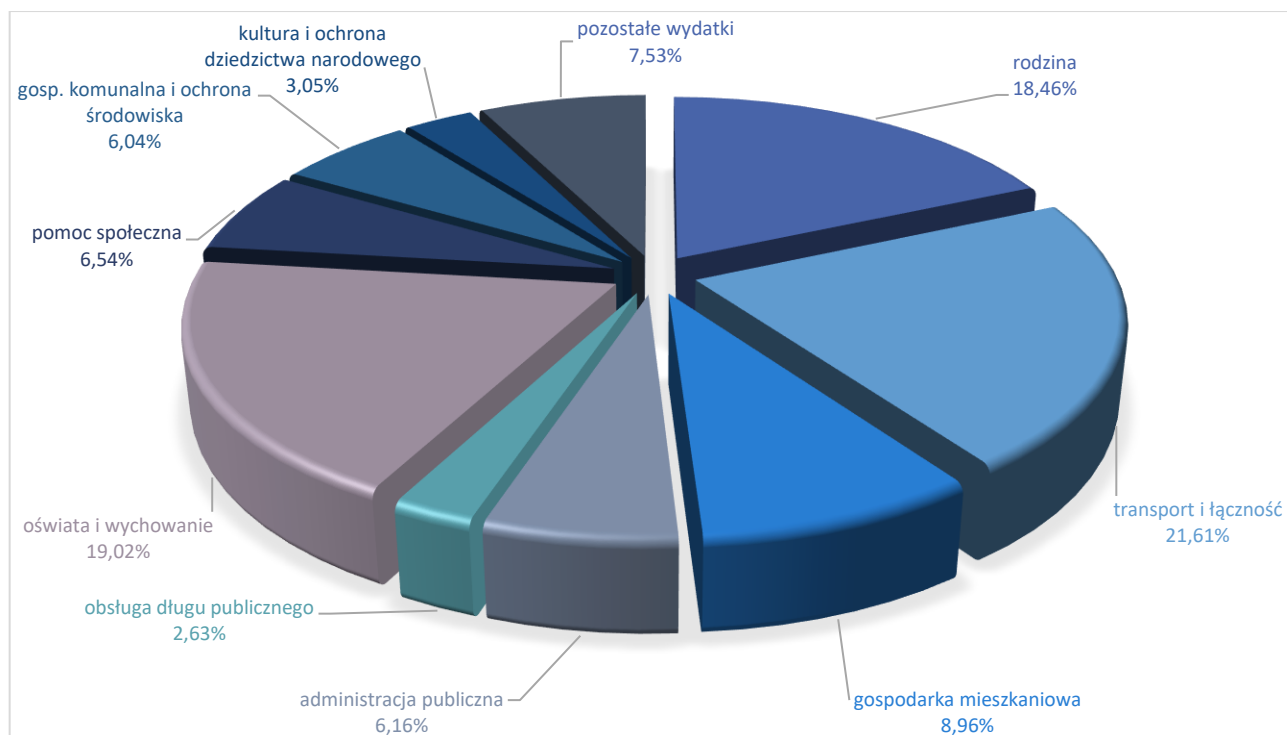

Wykres 2. Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za 2019 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Nominalnie wykonanie dochodów w 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 53.748.430,48 zł, co wynika głównie z wyższych wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE, subwencji oraz udziałów w podatkach PIT i CIT. Również wykonanie po stronie wydatków za 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest nominalnie wyższe o kwotę 92.439.083,81 zł.

Zadłużenie Miasta Wałbrzycha na koniec 2019 roku wynosiło 602.586.050,96 zł.

## 2 REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE MIASTA WAŁBRZYCHA

### 2.1 BUDOWA OBWODNICY MIASTA WAŁBRZYCHA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 35 OD KM 2+350 DO KM 8+250

Plan na rok 2019 to kwota 110 525 383,00 zł wykonanie wyniosło 90 167 625,84 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020, priorytet IV Infrastruktura Drogowa dla Miast, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 394.480.381,71 PLN, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 349.167.599,22 PLN i dofinansowania 296.792.459,33 PLN. Zadanie obejmuje budowę: dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja, nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego, trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę: ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, ul. Chrobrego na długości ok. 700 m oraz drogi gminne i lokalne – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej.

W roku 2019 w ramach realizacji inwestycji poniesiono wydatki na roboty budowlane – 87.110.664,71 zł, nadzór inwestorski – 534.032,98 zł, uzdatnianie podłoża – 2.246.649,12 zł, ubezpieczenie inwestycji – 227.220,00 zł oraz inne - m.in. nadzór nad uzdatnianiem – 49.059,03 zł.

## 2.2 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WPROWADZENIE ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ I PODMIEJSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA WYBUDOWANIU CENTRUM PRZESIADKOWEGO WAŁBRZYCH PLAC NA ROZDROŻU ORAZ POPRAWIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM I ENERGOOSZCZĘDNYM OŚWIETLENIU MIEJSKIM

Zadanie realizowane od roku 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Wydatki w 2019 roku dotyczyły wytyczenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu o łącznej długości 4.829 m oraz pokrycia zobowiązań roku 2018. Zadanie zakończone – pismo Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 19.12.2019 roku potwierdzające rozliczenie wniosku końcowego o refundację.

## 2.3 PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 367 I 381 NA OBSZARZE GMIN BOGUSZÓW - GORCE I WAŁBRZYCH WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY BOGUSZOWA - GORC I DZIELNICY SOBIĘCINA W WAŁBRZYCHU – („DROGA SUDECKA”)

Wydatki poniesione w 2019 roku na to przedsięwzięcie to 11.122.717,11 zł, wkład własny 1.417.062,45 zł , środki zewnętrzne 9.705.654,66 zł.

Dnia 27.04.2018 roku została podpisana Decyzja nr RPDS.05.04.04-02-0001/17-00 o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zakres inwestycji obejmuje: etap I – rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej na odcinku ok. 0,8 km, od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką, łącząca Wałbrzych z Kłodzkiem. Zadanie zostało zakończone. Zadanie obejmowało przebudowę skrzyżowania ul. Kamieniecka/ Noworudzka/ Głuszycka, zmianę geometrii jezdni ul. Kamienieckiej i jej poszerzenie o dodatkowy pas ruchu pojazdów powolnych, zmianę geometrii jezdni ul. Noworudzkiej i Głuszyckiej w zakresie niezbędnym do prawidłowego powiązania z projektowanym skrzyżowaniem typu rondo, budowę ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych, budowę chodników dla pieszych, budowę pochylni z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Dla zadania pn. „Przebudowa drogi 367 – obwodnica Wałbrzycha” (ul. 1 Maja – Zachodnia) dnia 06.09.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą w formule zaprojektuj-wybuduj oraz dnia 24.09.2019 roku z Inwestorem Zastępczym. Termin realizacji zadania – 31.08.2022 roku.

Pismem z dnia 29.08.2019 roku Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej wyraziła zgodę na zmianę zakresu rzeczowego projektu. Obecnie inwestycja jest realizowana bez wykonania zadania pn. "Budowa obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce (Etap II)", a środki finansowe dofinansowania dla tego zadania zostały przesunięte na zadania: „Przebudowa i rozbudowa ul. Kamienieckiej” oraz „Przebudowa drogi 367 – obwodnica Wałbrzycha”.

Podział wydatków środków zewnętrznych: EFRR – 8 761 289,27 zł, Budżet Państwa – 944 365,39 zł.

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa.

## 2.4 REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 35 - UL. WAŁBRZYSKA W WAŁBRZYCHU NA ODCINKU OD KM 14+530 DO KM 15+110

Wydatki poniesione w 2019 roku na to przedsięwzięcie to 457 140,98 zł.

Zadanie zostało zakończone w 2019r.. W ramach inwestycji wyremontowano 580 m drogi. Zakres robót obejmował: wymianę konstrukcji jezdni, ułożenie krawężników na długości 400 m, wykonanie 8 spustów wraz z przykanalikami, odtworzenie rowów.

#### 2.5 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116563D – UL. GARBARSKA W WAŁBRZYCHU WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ W RAMACH REWITALIZACJI

Wydatki poniesione w 2019 roku na to przedsięwzięcie to 830.458,32 zł.

Dnia 08.03.2019 roku został podpisany protokół odbioru dokumentacji projektowej. W ramach procedury przetargowej został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych, z którym 05.04.2019 roku została podpisana umowa. Wyłoniony został również nadzór inwestorski i podpisano umowę w dniu 08.04.2019 roku. Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Na obecnym etapie realizacji zakończone zostały roboty związane z usunięciem kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego. Wykonano również infrastrukturę odwodnienia korpusu drogowego. W około 70% wykonane zostały nawierzchnie z kostki i płyt kamiennych. Rozpoczęto układanie nawierzchni jezdnej. Planowany termin zakończenia zadania to 15.03.2020 roku

#### 2.6 MODERNIZACJA I BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - ZADANIE POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Wydatki poniesione na to przedsięwzięcie w roku 2019 to kwota 7.891.760,15 zł

Modernizacja budynków komunalnych jest realizowana w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. i zatwierdzony Przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów na rok 2019. Realizacja zadania wykonywana jest przez MZB sp. z o.o. i Biuro Lokalowe polegająca na wykonaniu modernizacji dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c.o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp.

#### 2.7 ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- 1) nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonych w obrębie Szczawienko 2 dz. 78/3, 78/4 oraz 82/9 (w pobliżu Palmiarni) stanowiących działki niezabudowane – 150.000,00 zł
- 2) zakup od osoby fizycznej działki zabudowanej garażem nr 372/3, obr. 21 Nowe Miasto w związku z planowaną inwestycją związaną z budową budynków mieszkalnych – 25.000,00 zł
- 3) zamianę nieruchomości – zbycie lokalu mieszkalnego Gminy Wałbrzych ul. Leśna 19/4 – 62.400,00 zł,
- 4) rozliczenie umowy inwestycyjnej – nabycie od spółki pod firmą MP Wałbrzych spółka z o.o. nieruchomości przy ul. Husarskiej 8 - 4.410.720,00 zł.

#### 2.8 BUDOWA CZTEROSEGMENTOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STASZICA W WAŁBRZYCHU

Wydatki poniesione na to przedsięwzięcie w roku 2019 to kwota 970.501,62 zł

Zadanie polega na budowie czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu ulic Staszica, Kubeckiego, Paderewskiego w dzielnicy Nowe Miasto. Budynek stanowi zabudowę uzupełniającą (plombową). Budynek składa się z czterech zróżnicowanych kolorystycznie i formalnie segmentów mieszkalnych z przestrzenią usługową w części parteru, tworzących pierzeję wypełniającą starą zabudowę kamienic. W budynku powstaną 43 mieszkania komunalne. Zostanie również zagospodarowane najbliższe otoczenie obiektu. W roku 2019 wykonano

aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dnia 06.08.2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót oraz w dniu 13.08.2019 roku z Inwestorem Zastępczym. W dniu 08.08.2019 roku przekazano Wykonawcy teren budowy. W 2019 roku wykonano część robót ziemnych, prowadzono prace konstrukcyjne żelbetowe i murowe na segmentach B, C, D. Planowane zakończenie zadania to sierpień 2020 roku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie to wrzesień 2020 roku. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

## 2.9 PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. PRZYWODNEJ W WAŁBRZYCHU NA CELE MIESZKANIOWE

Nakłady poniesione na tę inwestycję w roku 2019 to - 1 195 794,00 zł

Zadanie zakończone zostało w 2018 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego w styczniu 2019 roku. Poniesione wydatki dotyczą końcowego rozliczenia zadania.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 1.220.250,21 zł.

## 2.10 WAŁBRZYSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przedmiotem projektu jest przygotowanie obiektu przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla min. 12 podmiotów gospodarczych. Wsparcie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie skierowane do kilku grup najemców: firm nowo powstających, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej, firm planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności firmy należące do branż wykazanych w Inteligentnych Specjalizacjach Regionu) oraz firm, znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do 3 lat od daty założenia działalności).

W dniu 19 czerwca 2019 roku decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś priorytetowa – 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Podziałanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Typ - 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców.

W ramach zadania w 2019 roku poniesione zostały końcowe wydatki na studium wykonalności, zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej Tauron dla budynku oraz wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej uwzględniającej podział funkcjonalny budynku z nowymi instalacjami wewnętrznymi dostosowanymi do potrzeb Inkubatora. Ponadto w roku 2019 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót oraz zastępstwa inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzonych postępowań w grudniu 2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą oraz w styczniu 2020 roku na zastępstwo inwestycyjne.

W ramach prac budowlanych wykonana zostanie rozbiorca budynku gospodarczego bezpośrednio przylegającego do budynku przy ul. Młynarskiej 29, wraz z budową ściany oporowej. Projekt przewiduje również prace budowlane związane z zagospodarowaniem otoczenia wokół obiektu, w tym m. in. utworzeniem miejsc postojowych, uporządkowaniem terenu i roślinności, remontem ogrodzenia. W ramach przebudowy obiektu zostanie wykonany remont pomieszczeń i dostosowanie ich do nowych potrzeb, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana stropów, wykonanie nowych instalacji, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu oraz pozostałe prace termomodernizacyjne. W celu zapewnienia optymalnych warunków do inkubacji przedsiębiorstw, w projekcie przewidziano również zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

Utworzony w ramach projektu Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości stanowić będzie miejsce zapewniające optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Oprócz udostępnienia nowoczesnych przestrzeni biurowych, oferować będzie również szereg usług wspierających przedsiębiorstwa we wczesnej fazie ich rozwoju.



#### 2.11 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W WAŁBRZYCHU POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ I REMONT

Inwestycja zrealizowana w roku 2019 w kwocie 805.193,85 zł

W ramach zadania planuje się wykonać kompleksowy remont stropodachu, I i II piętra oraz przystosowanie parteru budynku na potrzeby przedszkola. W 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. We wrześniu 2019 roku podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym oraz z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania został wydłużony aneksem do lipca 2020 roku, ze względu na roboty dekarские oraz w związku z koniecznością uzyskania odstępstwa od przepisów p.poż ze względu na konstrukcję klatek schodowych i nie zachowaniem odpowiednich w obecnych czasach przepisów dotyczących odległości spoczniaków. Poniesione w 2019 roku wydatki dotyczą zmian w dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót realizowanych przez Wykonawcę. W obecnej chwili remont budynku jest na etapie zakończenia wszystkich rozbiórek, przygotowania podłoża ścian w klasach pod malowanie, ułożenia z ponad 50% zaawansowaniem instalacji elektrycznych oraz wykonaniem instalacji c.o. wraz z założeniem grzejników. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

#### 2.12 ADAPTACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 12 DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA WRAZ Z ARANŻACJĄ POMIESZCZEŃ ORAZ WYPOSAŻENIEM W KONIECZNE INSTALACJE

Inwestycja zrealizowana w roku 2019 w kwocie 480 267,00 zł.

Zadanie było realizowane w 2018 roku. W grudniu 2018 roku dokonano odbioru końcowego robót. Poniesione wydatki dotyczą końcowych płatności i stanowią zobowiązania roku 2018.

#### 2.13 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W WAŁBRZYCHU POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ I REMONT

Inwestycja zrealizowana w roku 2019 w kwocie 1.178.602,55 zł.

W ramach zadania wykonane będą roboty w zakresie termomodernizacji budynku szkoły (dwa budynki dydaktyczne połączone łącznikiem oraz łącznik basenu), remontu zaplecza sportowego szkoły (siłownia, sala gimnastyczna, sanitariaty) oraz wymiany ogrodzenia wraz z remontem parkingu i ciągów dla pieszych. W roku 2019 dokonano zapłaty za dokumentację realizowaną na podstawie umowy zawartej z Projektantem w listopadzie 2018 roku. Ponadto w sierpniu 2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót oraz z Inwestorem Zastępczym. Trwają prace wyburzeniowe w obrębie budynku przeznaczonego na zaplecze sportowe, prace termomodernizacyjne budynków dydaktycznych (ocieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana grzejników wraz z rurą na nowe). Planowany termin zakończenia robót to czerwiec 2020 roku. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

#### 2.14 MODERNIZACJA I BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - ZADANIE POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI SUBSTANCJI SZKOLNEJ W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA"

Inwestycja zrealizowana w roku 2019 w kwocie 1.482.967,13 zł.

#### **PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26**

##### 1) remont łazienek w budynku szkoły

Zadanie było kontynuowane z roku 2018. Zgodnie z umową i aneksem termin zakończenia prac to 30.04.2019 roku. Pomieszczenia objęte remontem to w segmencie "A" – 6 toalet dla dziewcząt, 6 toalet dla chłopców, 6 toalet dla



personelu, 3 toalety dla niepełnosprawnych oraz segmentie "B" – 3 toalety dla dziewcząt, 3 toalety dla chłopców, 3 toalety dla personelu, 3 toalety dla niepełnosprawnych, segment sali gimnastycznej - remont szatni chłopców i dziewcząt. Prace remontowe rozpoczęto we wrześniu 2018 roku, od lewego pionu w segmentie A (3 toalety dla dziewcząt, 3 toalety dla chłopców, 3 toalety dla personelu) od prac w zakresie robót rozbiórkowych, trasowania kabli energetycznych i teletechnicznych, trasowania i wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnych, wymiany instalacji c.o., wykonania obudowy tynków ścian i sufitów, zabudowania pionów i stelaży, zamontowania drzwi i okien PVC, wylania posadzek, przygotowania ścian pod lamperie z okładzin PVC, wykonania okładzin ściennych, montaż lamp i osprzętu elektroinstalacyjnego, wykonania okładzin PVC. W grudniu 2018 roku wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe w pionie segmentu B. Następnie kontynuowano prace remontowo - rozbiórkowe w segmentie B, wykonano zamontowanie drzwi i okien PVC, obudowy tynków ścian i sufitów, prace montażowe wodno-kanalizacyjne. Pod koniec stycznia br. ukończono pierwszy pion toalet w lewej części segmentu A. Kolejno został wykonany pion w prawej części segmentu A oraz toalety dla niepełnosprawnych. Na wniosek inwestora zwiększono zakres remontowy w szatni dziewcząt, obie szatnie zostały wykonane w tym samym standardzie. Prace remontowe zostały zakończone pod koniec kwietnia 2019 roku. Odbiór końcowy robót odbył się w maju 2019 roku.

2) wykonanie ogrodzenia systemowego oraz wzmocnienia konstrukcji piłkochwyłów

Zadanie zostało zakończone w grudniu 2018 roku. Płatność została dokonana w roku 2019.

## 2.15 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W GMINIE WAŁBRZYCH

Inwestycja zrealizowana w roku 2019 w kwocie 2.669.564,60 zł.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej, zlokalizowanego przy ul. Gen. Władysława Andersa 162a w Wałbrzychu. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia. Zakłada się zmianę sposobu użytkowania budynku po dawnej Szkole Podstawowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, przewidzianego na maksymalnie 30 miejsc całodobowego pobytu dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Zaprojektowano przebudowę istniejących pomieszczeń, rozbudowę i nadbudowę związaną z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb planowanej funkcji dla 30 osób zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

W styczniu 2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót, w kwietniu 2019 roku z Inwestorem Zastępczym oraz w maju 2019 roku na nadzór autorski. W 2019 roku prowadzono roboty rozbiórkowe (zbić tynków, rozbiórki ścianek, stropów, posadzek, podłóg, przebicia w stropach i ścianach itp.). Wykonano: wykopy wokół budynku, hydroizolację pionową ścian fundamentowych, przyłącze kanalizacji sanitarnej, płytę betonową pod nową klatkę schodową, ściany szybu windowego, rozbiórkę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, wykonano częściowo (ułożono przewody zasilania głównego oraz wewnętrznych linii elektrycznych do rozdzielnic piętrowych, przewody oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego na I piętrze i w istniejącej klatce schodowej oraz instalacje gniazd wtyczkowych i siły na I piętrze i w kotłowni, ruraż instalacji (centralnego ogrzewania, wodociągowej, sanitarnej, gazowej), podejścia odpływowe instalacji kanalizacji sanitarnej i wody, montaż zaworów odcinających i regulacyjno-cyrkulacyjnych instalacji wody, izolacje z pianki poliuretanowej na rurach wodociągowych i c.o.). Ponadto zakończono budowę nowej klatki schodowej i budowę kotłowni gazowej w budynku. Wykonano pokrycie dachu z dachówki ceramicznej, oczyszczenie i hydrofobizację elewacji budynku, włączenie kanalizacji deszczowej do kolektora w ulicy, parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych, przyłącza kanalizacji sanitarnej, tynki wewnętrzne, docieplenie ścian od wewnątrz, podłóża i posadzki cementowe, wewnętrzne instalacje: sanitarne, gazowe, wodociągowe, elektryczne (bez urządzeń i osprzętu). Zamontowano również stolarkę okienną i windę. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania w robotach budowlano-montażowych to 20.04.2020 roku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie to 30.06.2020 roku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

## 2.16 Utworzenie placówek wsparcia dziennego oraz domów pobytu na obszarze objętym rewitalizacją

Przedsięwzięcie zrealizowane w kwocie 681.015,88 zł.

Zadanie polegało na utworzeniu Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu. W roku 2018 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową określającą zakres rzeczowy polegający na przystosowaniu parteru obiektu do dziennego domu pobytu osób starszych. Po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego w I półroczu 2019 roku wyłoniono Inwestora Zastępczego oraz Wykonawcę robót. W sierpniu 2019 roku podpisano umowę zarówno z Inwestorem Zastępczym jak i Wykonawcą robót. W ramach robót wykonano wymianę stolarki drzwiowej oraz montaż stolarki okiennej, prace wykończeniowe z wyposażeniem pomieszczeń lokalu takich jak: kuchnia oraz zmywalnia, pomieszczenia sanitarne, sala do aktywności ruchowej (sprzęt do ćwiczeń, drabinki), szatnia, pomieszczenie pokoju pielęgniarstwa oraz sala spotkań oraz jadalnia, ponadto sprzęty elektroniczne. Ponadto wykonano nowe instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje wentylacji mechanicznej, nowe instalacje elektryczne i teletechniczne, a także prace dotyczące zagospodarowania terenu tj. montaż prefabrykowanej altany, schody terenowe, wykonanie uzupełnienia muru ceglanego, montaż balustrad, wykonanie chodnika. Obiekt został przystosowany dla 30 osób. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2019 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót.

Zadanie uzyskało dotację z budżetu państwa na zadania własne w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020 Edycja 2019.

## 2.17 Adaptacja części budynku przedszkola samorządowego nr 17 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi przy ul. Sosnowej 25A na żłobek samorządowy nr 8 w Wałbrzychu

Przedsięwzięcie zrealizowane w kwocie 2.247.555,63 zł

Zadanie polegało na wydzieleniu części budynku i adaptacji pomieszczeń części budynku na potrzeby żłobka dla 45 dzieci. Wykonane zostało dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, pożarowych, wydzielenie i kompleksowy remont istniejących pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, wydzielenie z pomieszczeń istniejących toalet na potrzeby żłobka, modernizacja istniejącej kuchni na potrzeby żłobka i przedszkola – technologia kuchni z doborem mebli i urządzeń gastronomicznych, instalacja wideofonu z łączaniem na poszczególne grupy, aranżacja pomieszczeń z doborem wyposażenia w meble, wydzielenie i zagospodarowanie terenu w zakresie utworzenia placu zabaw dla żłobka oraz ogrodzenie terenu. W maju 2019 roku wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W sierpniu 2019 roku podpisana została umowa z Wykonawcą robót. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2019 roku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Maluch+ 2019.

## 2.18 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

W ramach zadania w 2019 roku dotację otrzymały:

- Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 11 na zadanie: "Remont dachu i elewacji północnej oraz docieplenie stropu strychu i elewacji południowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego Rynek 11, 58-300 Wałbrzych" – 67.566,98 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na zadanie: "Prace ratownicze i konserwatorskie wieży głównej kolegiaty Aniołów Stróżów w Wałbrzychu – etap 2- górna część wieży, ściany A,C,D,E" - 600.000,00 zł

- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Wałbrzychu na zadanie: "Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego pw. św. Anny w Wałbrzychu" – 56.722,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu na zadanie: "Wymiana pokrycia dachu wraz z systemem odprowadzania wód opadowych z kościoła św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu" – 300.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu na zadanie: „Ratunkowa wymiana stropu nad nawą główną wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu” - 99.941,27 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu na zadanie: „Wymiana okien w wieży oraz wymiana pokrycia dachu nad prezbiterium A4 i absydy boczne A6 XIX -wiecznego Kościoła pod wezwaniem św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu” - 32.730,98 zł.

### 2.19 BUDOWA DOŚWIETLACZY PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W maju 2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej na wykonanie doświetlaczy na ulicach i skrzyżowaniach: ul. Sikorskiego – ul. Dojazdowa (2 kpl.), ul. Wrocławska – ul. Odlewnicza, ul. Długa, ul. Armii Krajowej 73, ul. Armii Krajowej, ul. Głogowska, ul. Andersa – ul. Piasta, Al. Wyzwolenia – ul. Kościuszki, Al. Wyzwolenia – ul. Kopernika, ul. Mickiewicza 44, ul. 1 Maja – Sklep „BIEDRONKA”, ul. 1 Maja 75, ul. Niepodległości 162.

### 2.20 Z TROPIKU DO TROPIKU NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU W RAMACH EWT

Inwestycja zrealizowana w roku 2019 w kwocie - 5 752 714,00 zł

W ramach zadania wykonano remont szklarni od nr 7 do nr 12 oraz nr 26 (roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe, czyszczenie konstrukcji stalowej, wymiana szklenia), remont przybudówki i wyburzenie oraz odbudowa budynku socjalnego, a także przygotowanie miejsca ekspozycyjnego dla zwierząt z ZOO do sezonowego pobytu. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2019 roku, odebrane protokołem odbioru robót w grudniu 2019 roku. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

### 2.21 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OGRANICZENIEM NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA

Przedsięwzięcie zrealizowane w kwocie 1 296 025,53 zł

Zadanie ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych z pieców i kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczania emisji innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Wałbrzychu. Realizowane jest na podstawie zawieranych umów o dotację z osobami fizycznymi lub prawnymi. W 2019 roku zawarto 282 umowy dotacji celowej związanej ze zmianą systemu ogrzewania, w tym 281 umów z osobami fizycznymi oraz 1 z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

## 3 WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY (WBP)

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy.

Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny jest okazją do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta.

Do końca 2019 roku w Wałbrzychu odbyło się 6 edycji budżetu partycypacyjnego.

### 3.1 ZADANIA WBP ZAKOŃCZONE W ROKU 2019

#### **„AKTYWNY GAJ” - PROJEKT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, PLENEROWEJ DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY GAJ – WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017**

W ramach zadania w roku 2018 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie polegało na dostawie i montażu elementów siłowni zewnętrznej na dziesięć stanowisk: wyciąg i krzesło, biegacz i orbitrek, narty i wioślarz, surfer i twister, rower i jeździec, dostawie i montażu elementów małej architektury, dostawie i montażu stołu betonowego do tenisa stołowego. W 2019 roku przeprowadzono postępowanie w drodze zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. W lipcu 2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Roboty zakończono w sierpniu 2019 roku, inwestycję odebrano protokołem odbioru końcowego robót we wrześniu 2019.

#### **BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH NA PLACU PRZY WIEŻOWCACH UL. FORTECZNA WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017**

W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W czerwcu 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. W związku z przeprojektowaniem podbudowy pod nawierzchnię termin wykonania robót drogowych został zmieniony aneksem do końca września 2019 roku. W ramach inwestycji został wykonany teren z kostki betonowej oraz miejsca postojowe z płyt ażurowych. Ponadto zostały wykonane nowe nasadzenia oraz montaż nowych koszy betonowych. Roboty zostały zakończone w październiku 2019 roku i odebrane protokołem odbioru robót.

#### **BUDOWA PLACU MANEWROWEGO Z MIEJSCAMI PARKINGOWYMI PRZY WJEŹDZIE NA CMENTARZ PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. ANNY – WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017**

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W II połowie 2018 roku został wybrany Wykonawca robót dla zadania, termin zakończenia zadania przewidziany był na koniec kwietnia 2019 roku. Ze względu na awarie niezainwentaryzowanej sieci gazowej przedłużono termin wykonania do 30 dni od usunięcia awarii sieci gazociągu. W ramach zadania został wykonany plac manewrowy z miejscami postojowymi, zostało zamontowane nowe ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką wejściową, wykonany został również teren na wysepce z kostki granitowej 9/11 oraz wymienione zostały oprawy oświetleniowe na oprawy oświetleniowe dwustronne placu. Roboty zostały zakończone w lipcu 2019 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót.

#### **"PLAC ZABAW NOWE MIASTO" - WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY**

W ramach zadania wykonano wyposażenie istniejącego placu w elementy zabawowe - zestaw zabawowy, kiwak, huśtawka wagowa, huśtawka bocianie gniazdo, stół do gry w ping-ponga, nowy drenaż, nawierzchnię pod urządzenia zabawowe oraz nowe nawierzchnie trawiaste. Zadanie zostało zakończone w kwietniu 2019 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót w maju 2019 roku.

#### **PLAC ZABAW PRZY UL. OGIŃSKIEGO, NOWE MIASTO – WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017**

W ramach zadania wykonany został demontaż istniejących elementów zabawowych będących w złym stanie technicznym oraz przełożono istniejące elementy zabawowe będące w dobrym stanie technicznym, wykonano drenaż oraz studnię chłonną, ogrodzenie, montaż elementów zabawowych (piaskownica, karuzela tarczowa, bujak samochód, huśtawka wahadłowa) wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku atestowanego, montaż elementów małej architektury

(ławka parkowa, kosz na śmieci, tablica informacyjna) oraz uzupełnienie nawierzchni trawiastej na terenie wykonywanych robót. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego robót w kwietniu 2019 roku.

### 3.2 ZADANIA WBP W TRAKCIE REALIZACJI

#### **POSTAWIENIE OGRZEWANEGO PAWILONU Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZENOSZENIA I ZAKUP SAMOCHODU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU ZWIERZĄT NA RZECZ WAŁBRZYSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT – WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017**

W ramach zadania przeprowadzone zostały cztery postępowania przetargowe na dostawę samochodu. W wyniku ostatniego postępowania zakupiono samochód do przewozu zwierząt ze schroniska marki Peugeot Partner. Tymczasowo został wstrzymany przetarg na wykonanie robót związanych z postawieniem ogrzewanego pawilonu.

#### **BEZPIECZNE PODWÓRKO POMIĘDZY UL. PŁUGA, UL. KONOPNICKIEJ I UL. LEWARTOWSKIEGO - WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017**

Zadanie polega na wykonaniu zagospodarowania terenu, w tym utwardzenie i wyrównanie nawierzchni kostką betonową, wykonaniu terenów zielonych, placu zabaw wraz z elementami zabawowymi (karuzela, huśtawka sprężynowa, piaskownica, huśtawka podwójna, zestaw trzywieżowy), wykonaniu ogrodzenia z furtką wejściową, wyposażeniu placu w regulamin, wyposażeniu placu w elementy małej architektury oraz usadowienie stołu do ping-ponga. Poniesione w 2019 roku wydatki dotyczą wykonanej dokumentacji projektowej.

#### **DOKOŃCZENIE INWESTYCJI Z ROKU 2015 POD NAZWĄ „BUDOWA PARKINGU I NAPRAWA PIESZYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH” POLEGAJĄCEJ NA REMONCIE I BUDOWIE NOWYCH CHODNIKÓW, SCHODÓW TERENOWYCH I PORĘCZY, BUDOWA SCHODÓW DO PARKINGU – WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017**

W ramach zadania w roku 2019 została wykonana aktualizacja dokumentacji z pierwszego etapu. Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka chodnika jak i dokończenie przebudowy chodników, przebudowy schodów wraz z podjazdem dla wózków, przebudowę schodów do boksów śmietników, budowę schodów prowadzących do chodnika oraz remont schodów. Nie przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania.

#### **OGRÓDEK JORDANOWSKI – REAKTYWACJA - ETAP III OSTATNI CZĘŚĆ A: "INTEGRACJA RAZ, DWA, TRZY! - DZIECI, MŁODZIEŻ ORAZ MY" - WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017**

Poniesione wydatki dotyczą wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania, które obejmuje wykonanie boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchni poliuretanowej, montaż bramek bramkarskich wraz z siedziskami trybunowymi, montaż małej architektury oraz wykonanie chodników i naprawę schodów terenowych. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania. Rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od uzyskania decyzji na wycinkę drzew, na którą Gmina oczekuje od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

#### **PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO NA MIEJSCACH POSTOJOWYCH PRZY CMENTARZU NA BIAŁYM KAMIENIU UL. PIASKOWA – WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017**

Poniesione wydatki dotyczą wykonania prac projektowo – kosztorysowych oraz przyłączenia do sieci energetycznej. W ramach zadania przewidziano wykonanie parkingu z kostki betonowej wraz z oświetleniem placu. W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania, gdyż wartość kosztorysowa znacząco przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie.
